

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年01月22日

計画の名称	都留市下水道未普及地域解消（重点計画）													
計画の期間	平成30年度 ～ 平成31年度（2年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	都留市													
計画の目標	下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		707	A	707	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27年度当初	H29年度末	H31年度末
1	下水道処理人口普及率を27.6%（H27年度当初）から31.1%（H31年度末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	27%	29%	31%
	下水道を利用できる人口（人） / 総人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中核都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	都留市	直接	都留市	管渠（ 污水）	新設	東桂地区（普及促進）	L=0.2km	都留市	■	■				24		－
		H27年度から事業実施、L=0.6km、136百万円実施済み																	
	A07-002	下水道	一般	都留市	直接	都留市	管渠（ 污水）	新設	谷村地区（普及促進）	L=0.9km	都留市	■	■				194		－
	A07-003	下水道	一般	都留市	直接	都留市	管渠（ 污水）	新設	禾生地区（普及促進）	L=2.1km	都留市	■	■				489		－
		平成27年度から事業実施、L=3.0km、396百万円実施済み																	
											小計						707		
											合計						707		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
都留市社会資本整備総合計画評価会議	令和3年1月18日
	公表の方法
	都留市ホームページ


○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道処理人口普及率は25.8%から28.2%となり、新たに514人が使用できるようになった。また、本計画期間に28.8haの供用を開始した。※H26までの整備延長56.2km、本計画期間の整備延長5.1km、合計61.3km 本計画では3.5%増としていたが、2.4%増と目標達成に至らなかったが、井倉土地区画整理地内の整備を実施したことにより、今後の普及率増加が見込まれる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

整備は、費用対効果が十分得られる地域(古川渡(国道139号)及び井倉)の整備を優先して実施する。 また、今後の人口減少を鑑み、認可区域(5年を目途に実施する区域)を令和元年度に822haから554haに見直し、下水道施設が必要な地域の選定並びに整備を行うことにより、汚水処理人口普及率及び水洗化率の向上を図る。(水洗化率とは、供用開始人口に対する水洗化人口の割合で、宅内配管を公共ますに接続すれば増加)
--

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			本計画の禾生地区では井倉土地区画整理が実施され、この地域への下水道整備が約5割を占めているが、当該地域の建築が遅れていることが目標普及率(区域内人口/行政人口)に達しなかった大きな要因であり、また、本計画実施に要する費用が十分確保できなかったことも考慮される。なお、目標値については、当初27.6%と設定したが、人口数値に差異が認められ25.8%と改めたことにより、増加率12.6%増のところ、9.3%増となった。
	最 終 目標値	31%	
	最 終 実績値	28%	

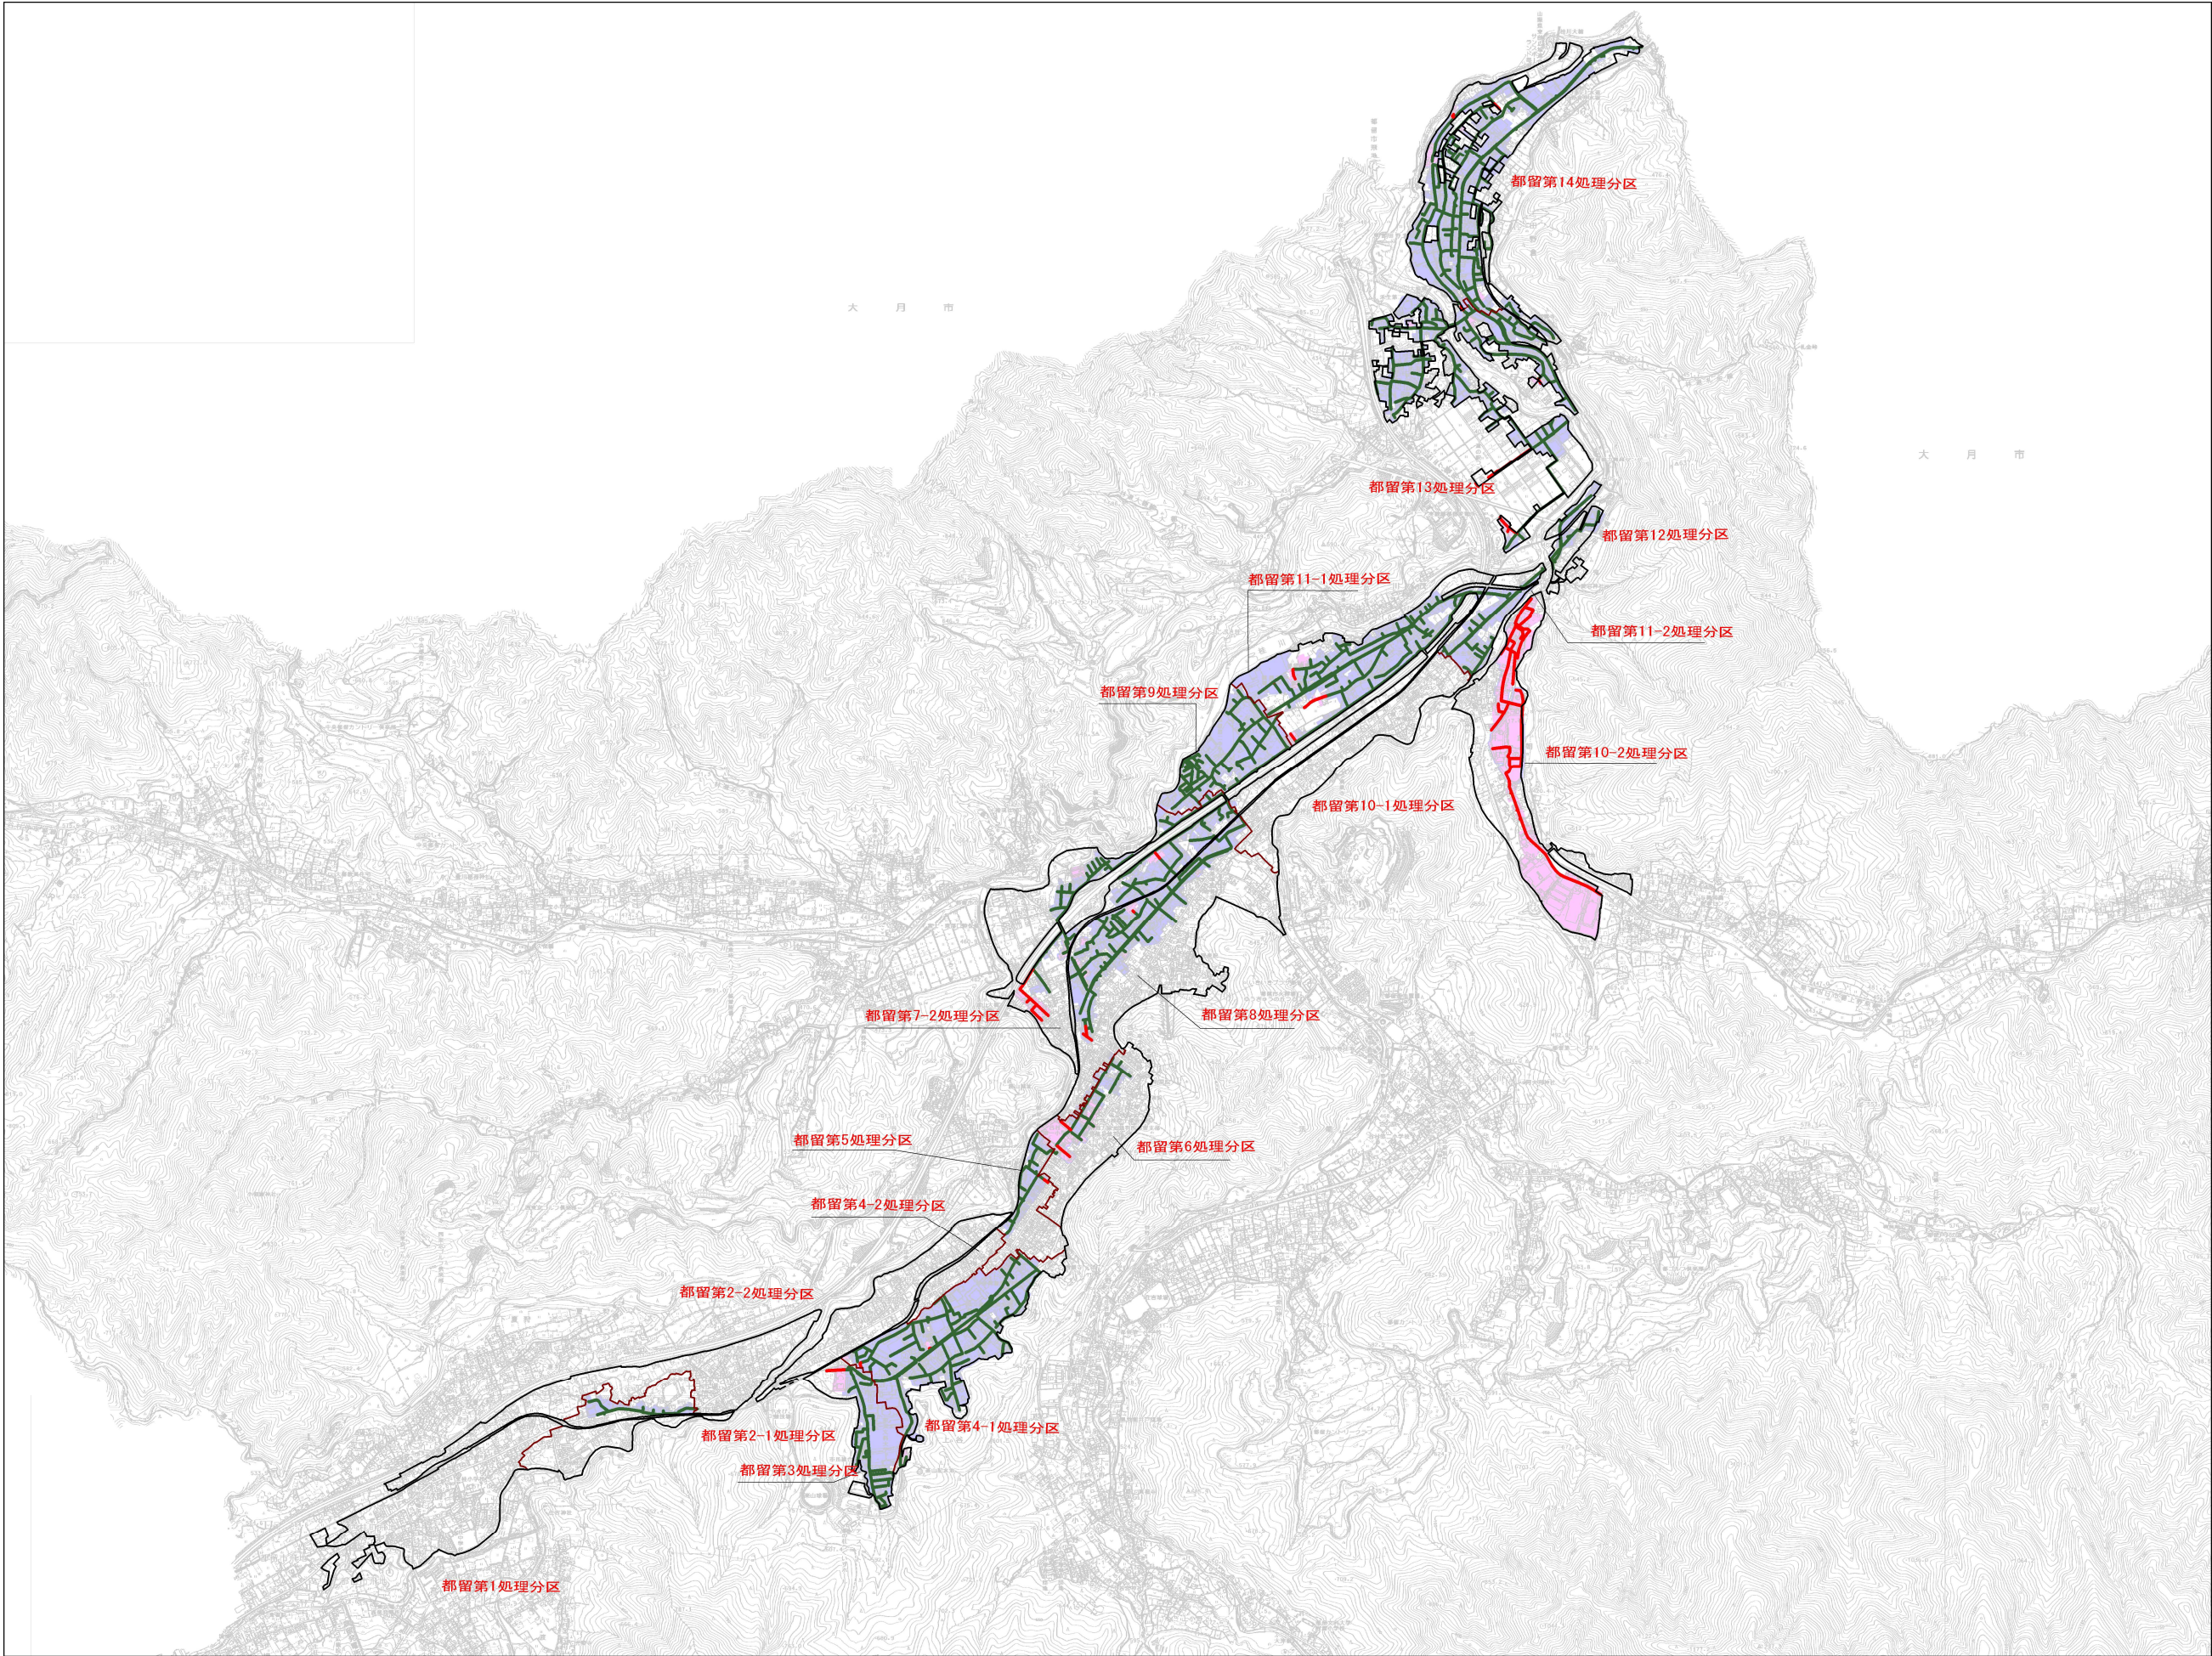

凡 例

告示区域

過年度工事

H27年度～H31年度工事

施工年度

過年度工事

H27年度～H31年度工事

下水道計画

全体計画区域

処理分区

[下水道台帳図]
